

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS**  
**01/02/2024 a 29/02/2024**

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes  
da UFOB - Barreiras -Ba**

**DADOS DA OBRA:**

- Empresa: 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA
- Termo de Contrato nº ..... : 011/2023.
- Processo Administrativo nº ..... :23520.007597/2021-82
- Data de início..... : 14/07/2023
- Previsão de Término..... : 14/07/2024
- Aditivo de prazo .....: 00,00
- Valor do Inicial do Contrato ..... : R\$ 459.000,00
- Valor do Atual do Contrato ..... : R\$ 459.000,00
- Ritmo do Contrato ..... : em execução
- Período de medição ..... : 01/02/2024 a 29/02/2024
- Valor da última medição..... : R\$ 30.559,17
- Valor acumulado..... : R\$ 180.559,17
- Saldo contratual..... : R\$ 278.440,83

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes  
da UFOB- Barreiras-Bahia**

Em atendimento a solicitação do setor de fiscalização da UFOB, apresentamos relatório fotográfico dos serviços executados na Estação de Tratamento de Efluentes da UFOB.



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

<b>Responsável:</b> Denis Ulisses Souza dos Santos	<b>Período:</b> 01/02/2024 a 29/02/2024	<b>Data da Elaboração:</b> 29/02/2024
---	--	--

Serviços	STATUS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE , NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB, EM BARREIRAS	

SERVIÇOS	STATUS
----------	--------

**Relatório fotográfico serviços executados no período**

<p>2D Engenharia Sustentável S-12° 8,908, W-45° 1,043 254° W 1 de fev. de 2024 08:40:55</p>	<p>2D Engenharia Sustentável 242° SW 1 de fev. de 2024 09:25:10</p>
<p>2D Engenharia Sustentável S-12° 8,898, W-45° 1,351 295° NW 1 de fev. de 2024 11:21:19</p>	<p>2D Engenharia Sustentável S-12° 8,895, W-45° 1,031 246° SW 2 de fev. de 2024 08:52:22</p>

**Observações:** Limpeza da lagoa de armazenamento.

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização





**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

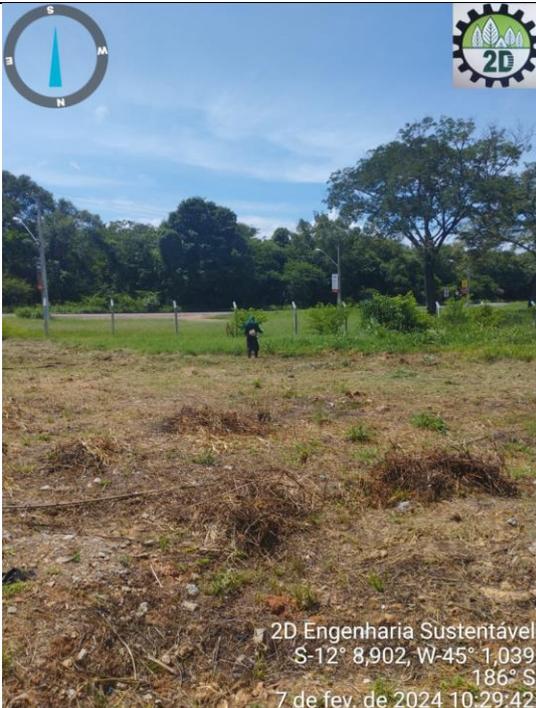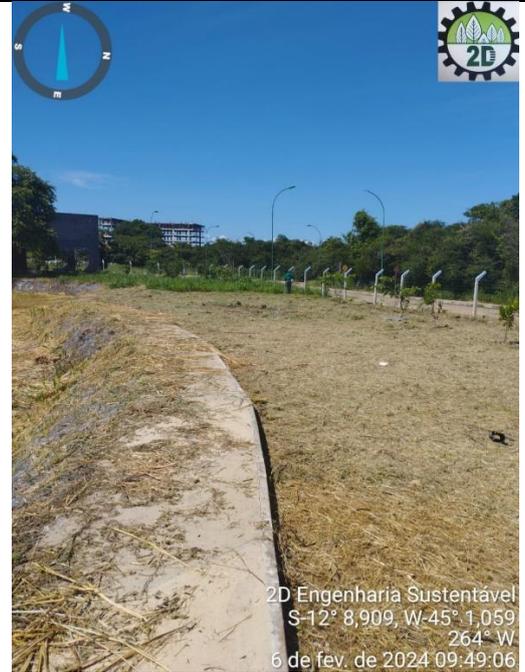

**Observações:** limpeza de vegetação no entorno da lagoa de armazenamento.

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização





**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

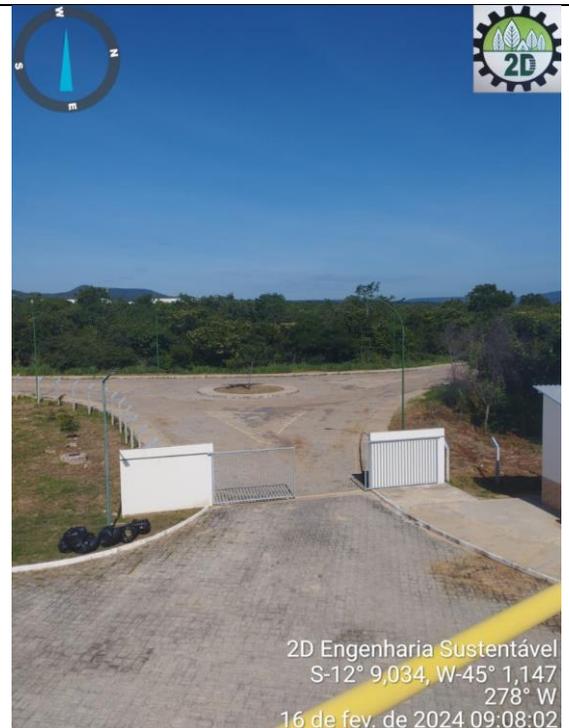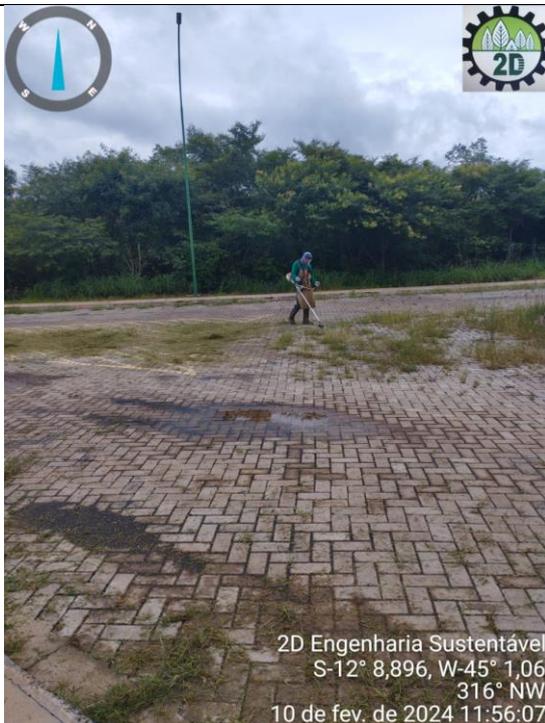

**Observações:** limpeza de vias externas da estação.


CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

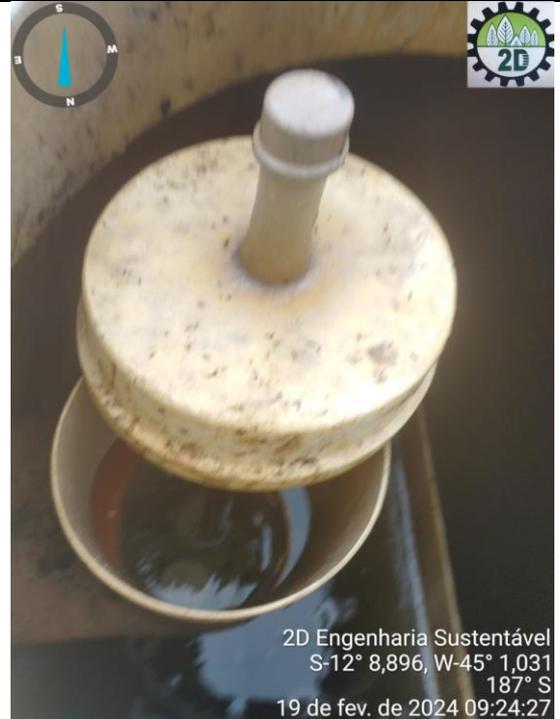

**Observações:** reposição de pastilhas de cloro e coleta de amostras para análise em laboratório.




**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

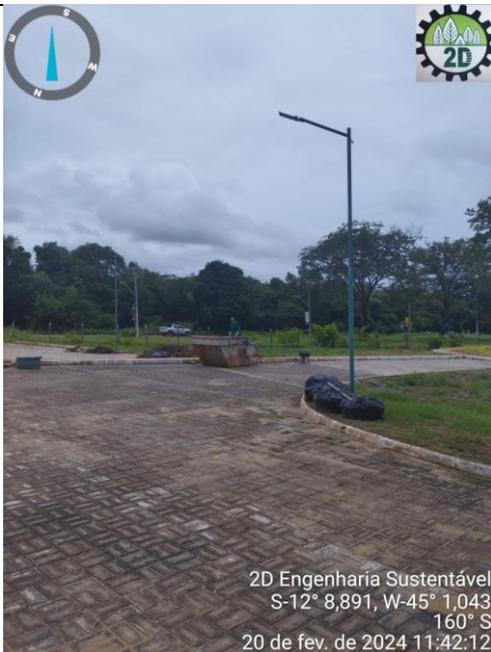

**Observações:** recebimento de container para retirada de material.

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização




**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024



**Observações:** limpeza de vias internas.

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização




**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

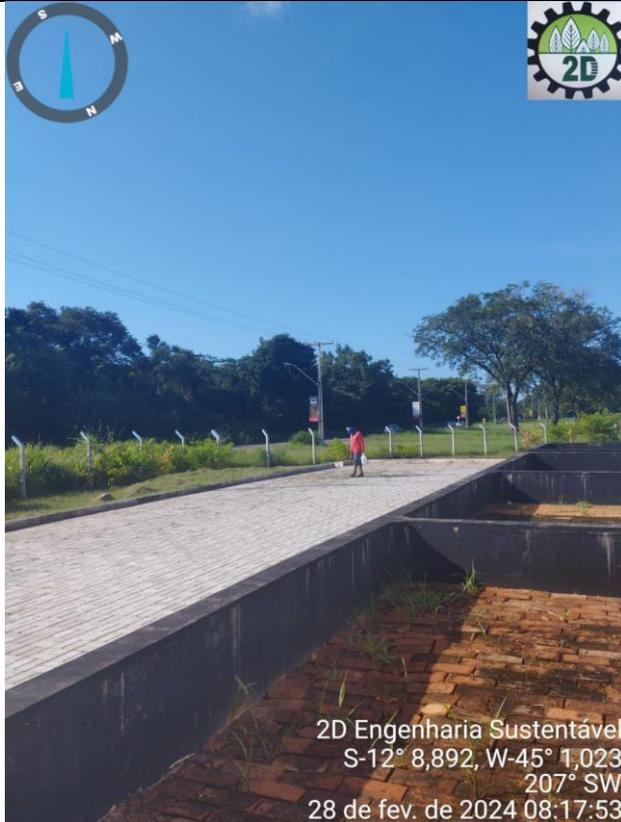

**Observações:** aplicação de defensivos em vias internas.




CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

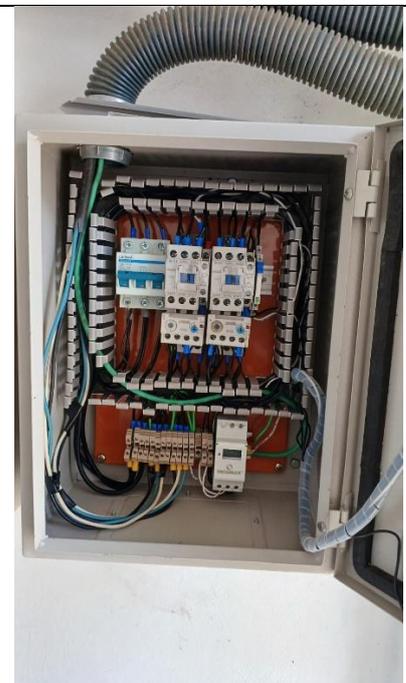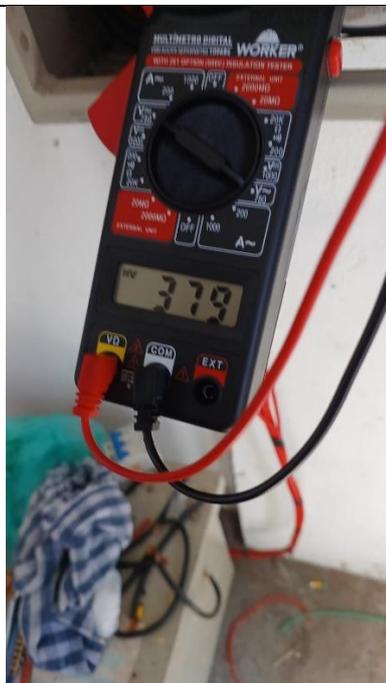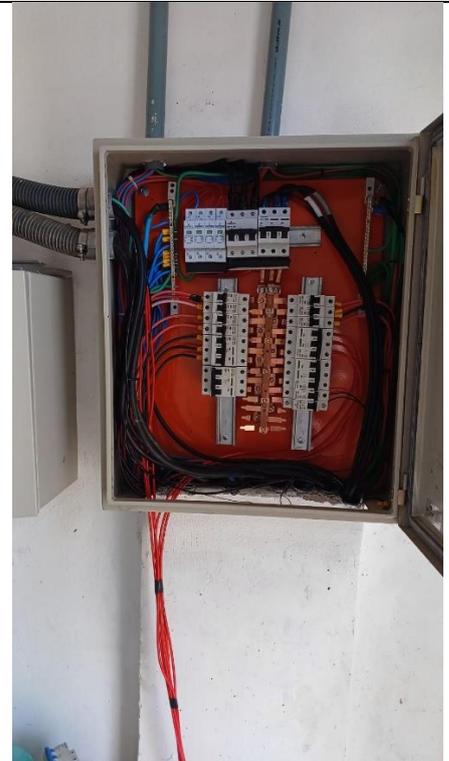

**Observações:** automatização do quadro elétrico dos sopradores.




**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

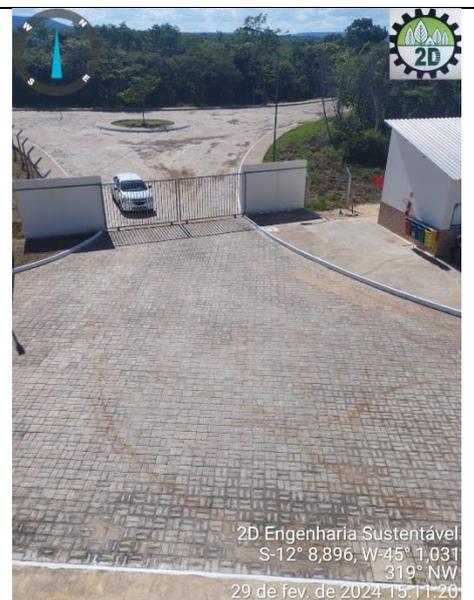

**Observações:** aplicação de defensivos em vias internas.

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização





**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**  
**Relatório de Serviços Executados**  
**Estação de Tratamento de efluentes**  
**da UFOB**

**Responsável:**  
Denis Ulisses Souza dos Santos

**Período:**  
01/02/2024 a 29/02/2024

**Data da Elaboração:**  
29/02/2024

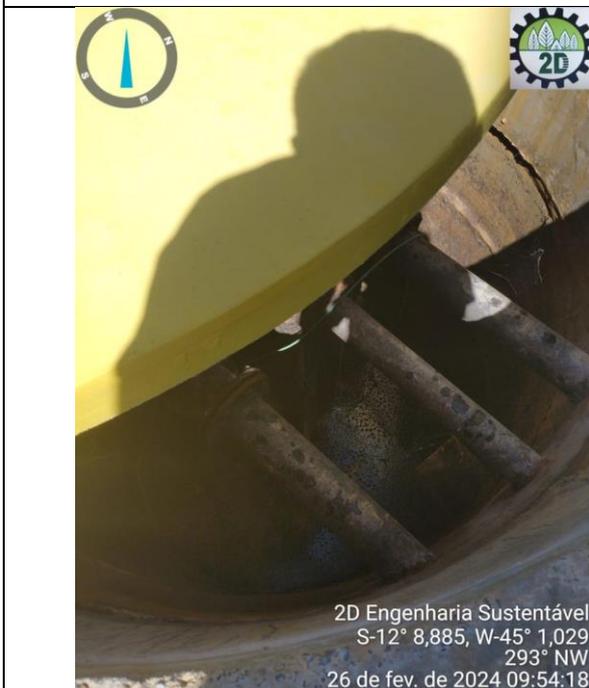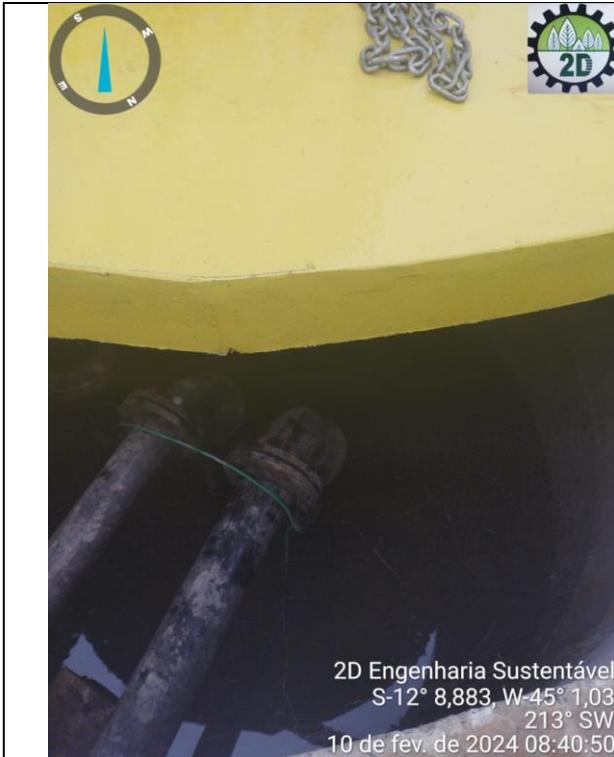

**Observações:** mudança na coloração do esgoto, oriundo de águas pluviais.

Lauro de Freitas 01 de março de 2024

CONTRATADO  
2D Engenharia Sustentável LTDA  
Denis Ulisses S. Santos  
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE  
Universidade Federal do Oeste da Bahia  
Fiscalização
