

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS
01/04/2024 a 30/04/2024

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB - Barreiras -Ba**

DADOS DA OBRA:

- Empresa: 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA
- Termo de Contrato nº : 011/2023.
- Processo Administrativo nº :23520.007597/2021-82
- Data de início..... : 14/07/2023
- Previsão de Término..... : 14/07/2024
- Aditivo de prazo: 00,00
- Valor do Inicial do Contrato : R\$ 459.000,00
- Valor do Atual do Contrato : R\$ 459.000,00
- Ritmo do Contrato : em execução
- Período de medição : 01/04/2024 a 30/04/2024
- Valor medido..... : R\$ 00,00
- Valor acumulado..... : R\$ 252.704,67

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB- Barreiras-Bahia**


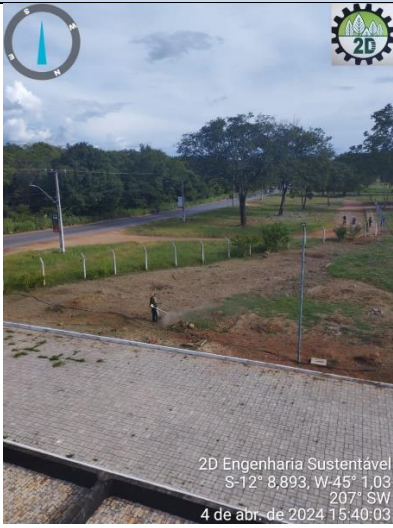

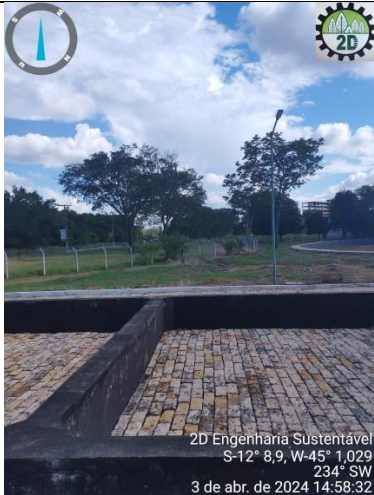
Em atendimento a solicitação do setor de fiscalização da UFOB, apresentamos relatório fotográfico dos serviços executados na Estação de Tratamento de Efluentes da UFOB.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável: Denis Ulisses Souza dos Santos	Período: 01/04/2024 a 30/04/2024	Data da Elaboração: 02/05/2024
---	--	--

Serviços	STATUS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE , NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB, EM BARREIRAS	

SERVIÇOS	STATUS
Relatório fotográfico serviços executados no período	
	
	
Observações: Limpeza de vegetação.	

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização







RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

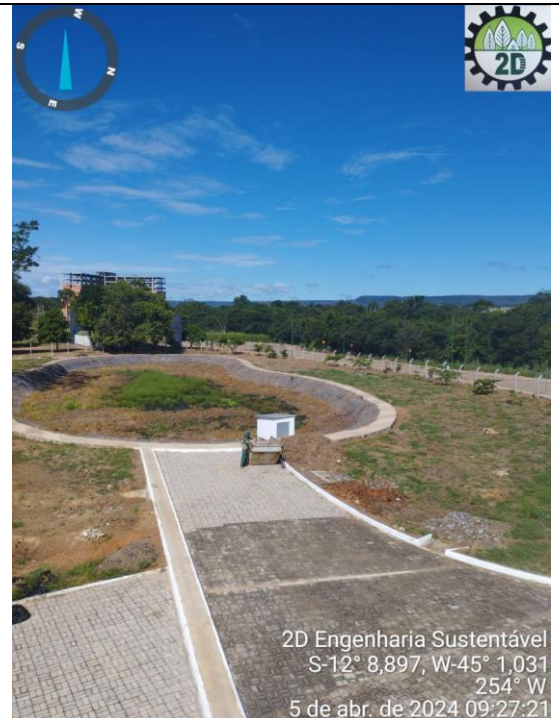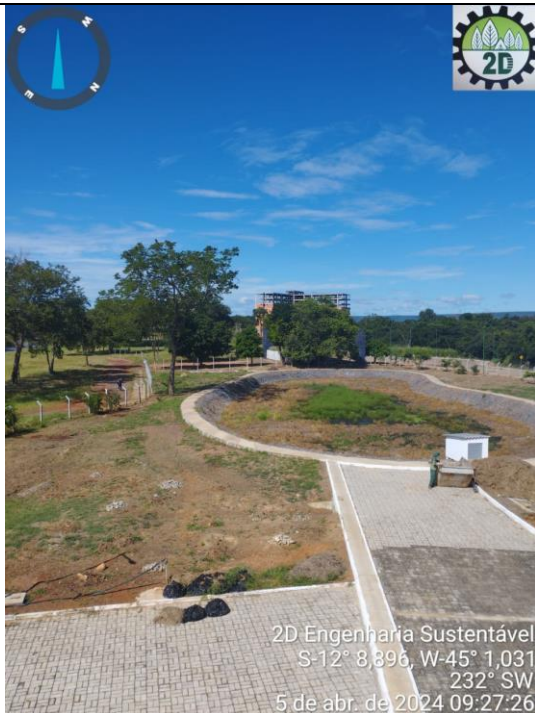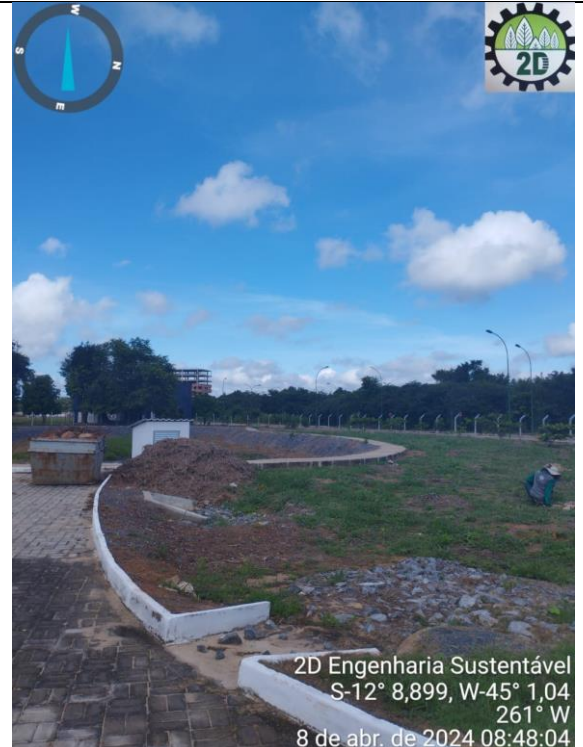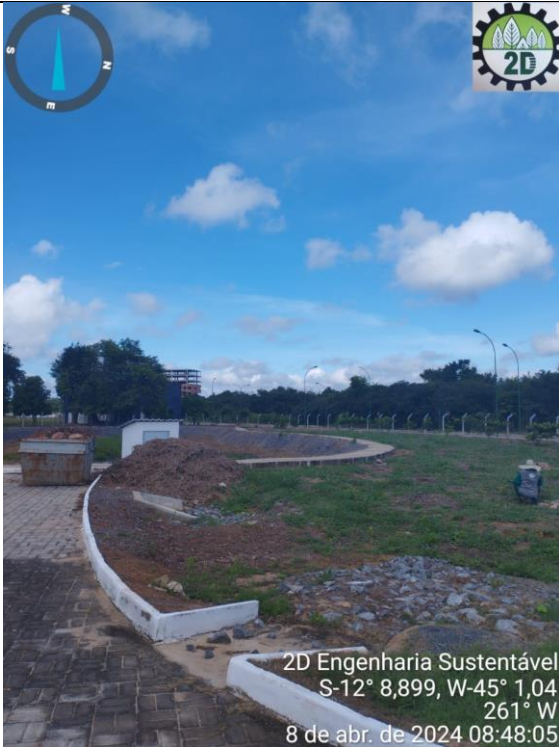

Observações: recolhimento de entulho e materiais.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

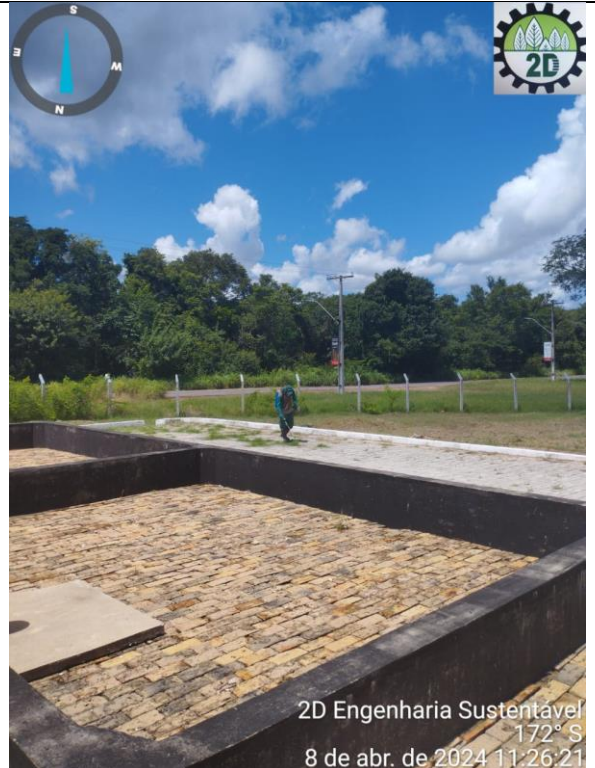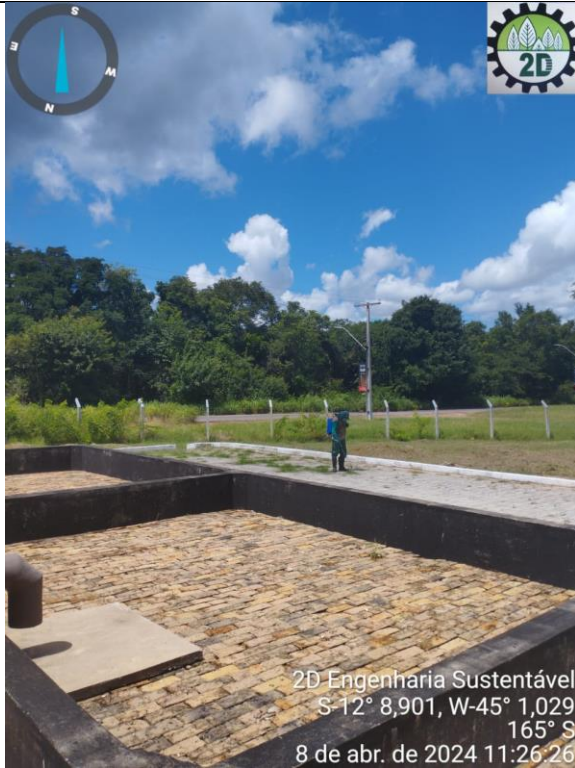

Observações: aplicação de defensivos em vias internas.


CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

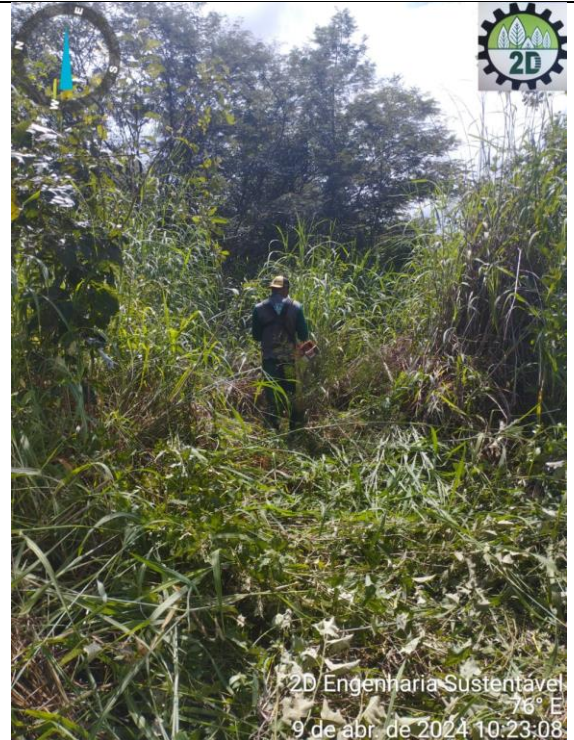

Observações: serviço de limpeza e localização de poços de visita.




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

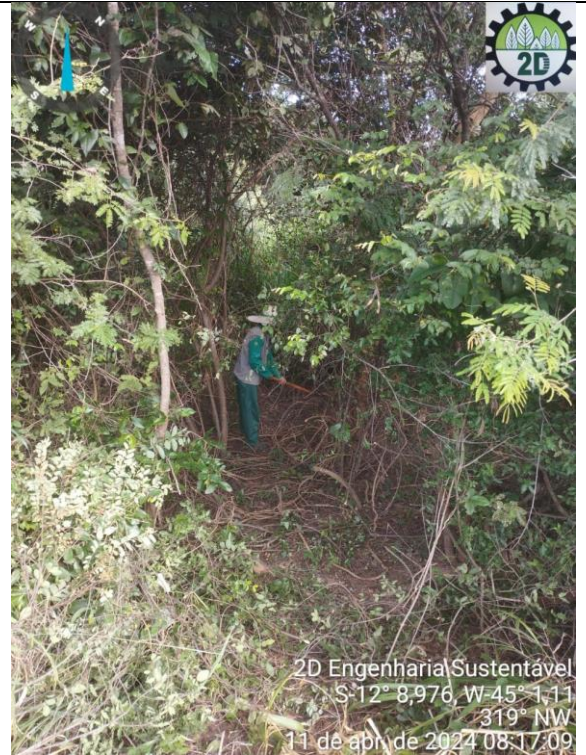

Observações: serviço de limpeza e localização de poços de visita.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,938, W-45° 1,06
284° W
12 de abr. de 2024 16:04:16



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,899, W-45° 1,032
258° W
12 de abr. de 2024 14:05:52



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,898, W-45° 1,03
282° W
11 de abr. de 2024 16:51:13



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,894, W-45° 1,028
272° W
11 de abr. de 2024 16:50:41

Observações: limpeza de vegetação.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024


Data da Elaboração:
02/05/2024




2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,894, W-45° 1,032
45° NE
24 de abr. de 2024 16:38:55



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,891, W-45° 1,067
46° NE
25 de abr. de 2024 09:59:41

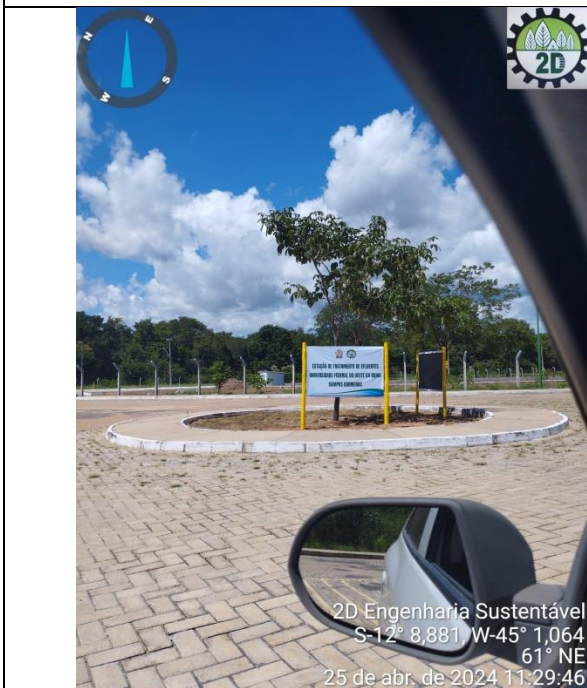

2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,881, W-45° 1,064
61° NE
25 de abr. de 2024 11:29:46

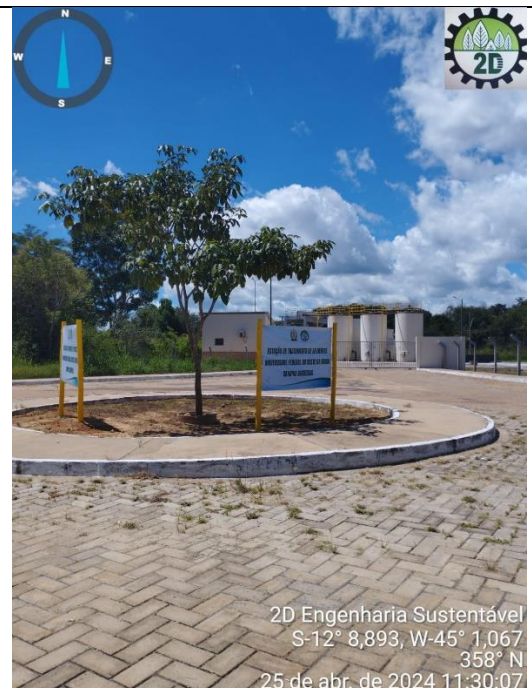

2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,893, W-45° 1,067
358° N
25 de abr. de 2024 11:30:07

Observações: instalação de placas de identificação na entrada da estação.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

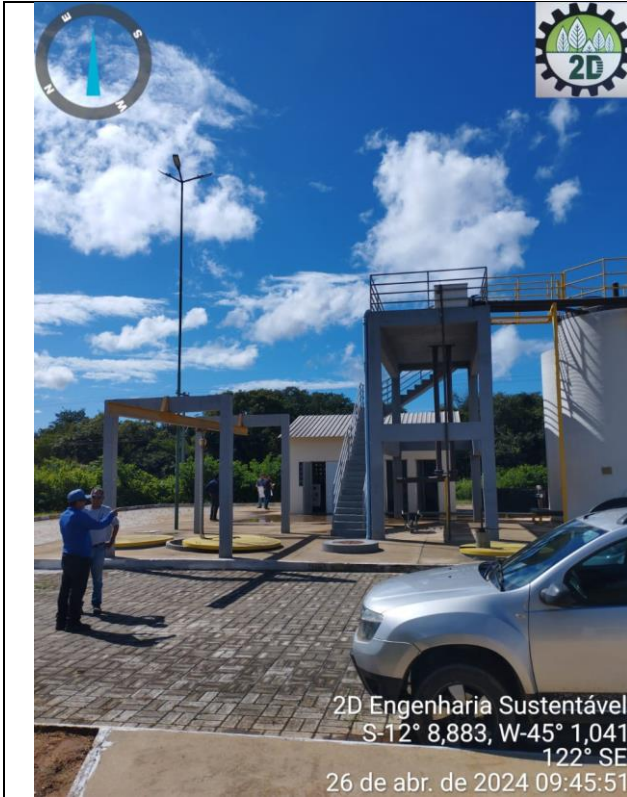

Observações: vistoria da prefeitura para emissão do habite-se.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

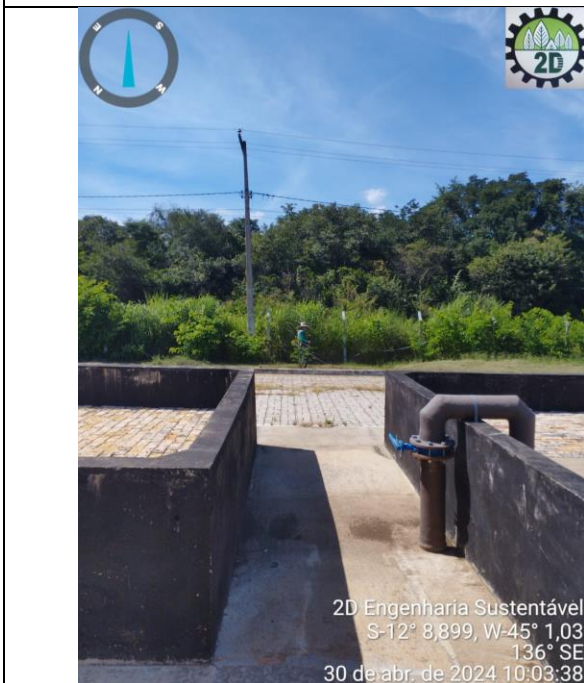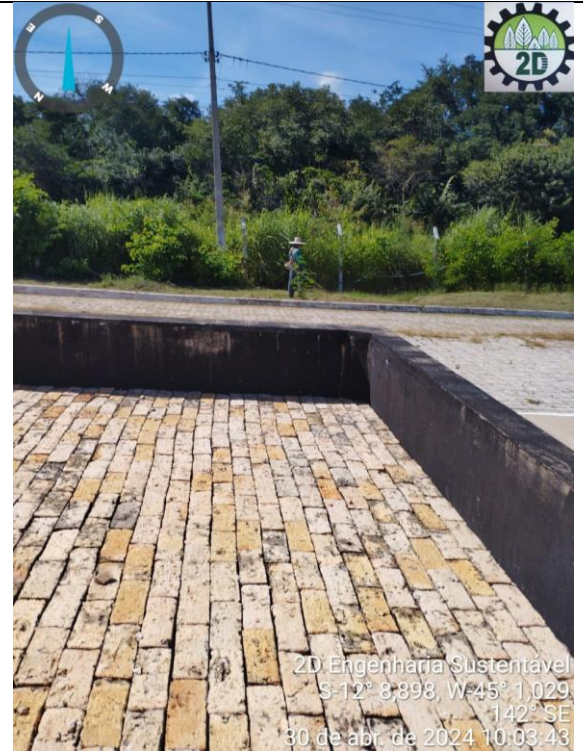

Observações: limpeza de vegetação.


CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

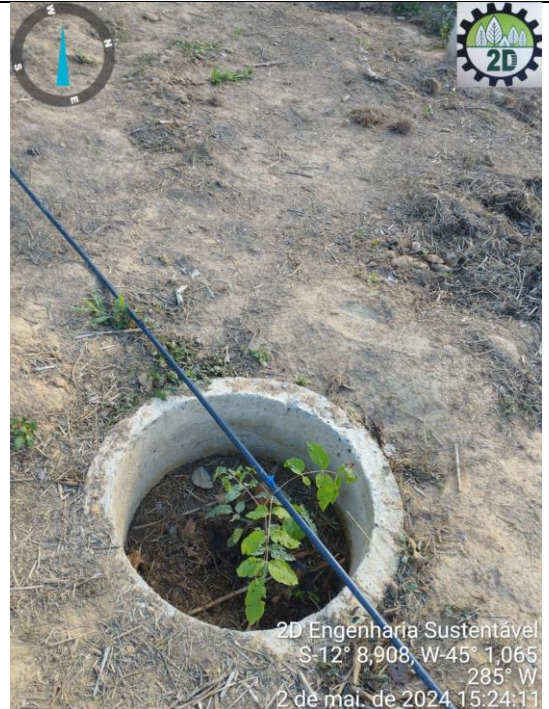

Observações: sistema de irrigação para arvores.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024



Observações: aquisição de novos materiais e equipamentos.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

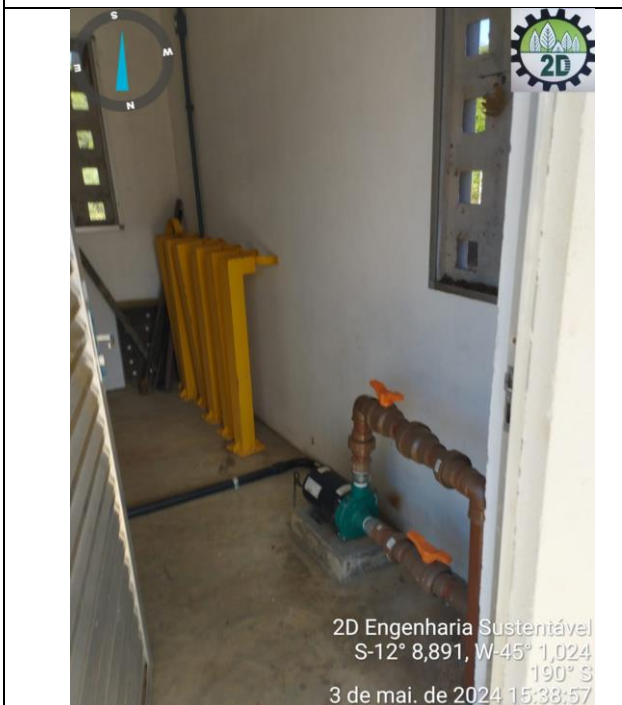

Observações: casa de máquinas.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/04/2024 a 30/04/2024

Data da Elaboração:
02/05/2024

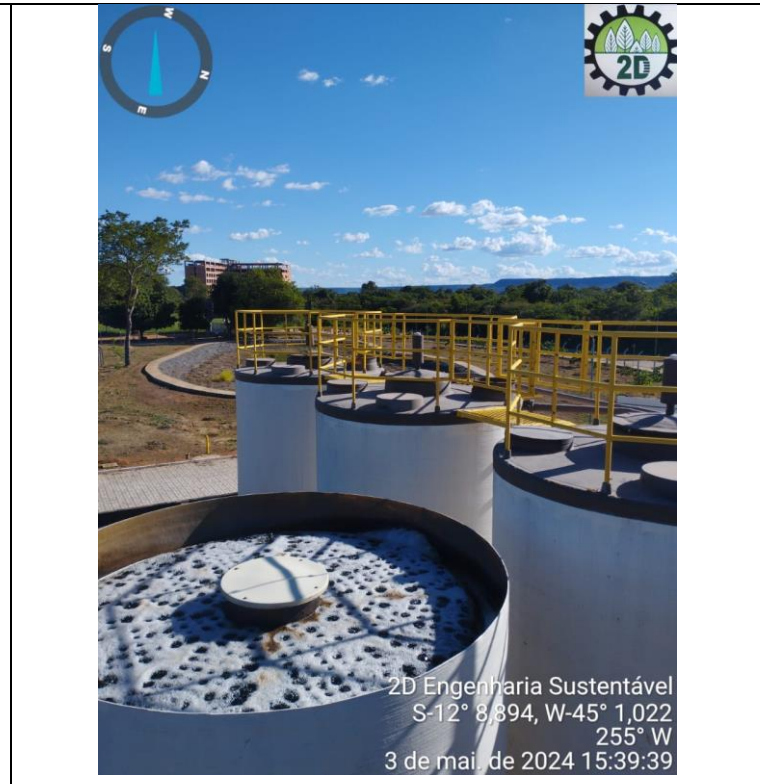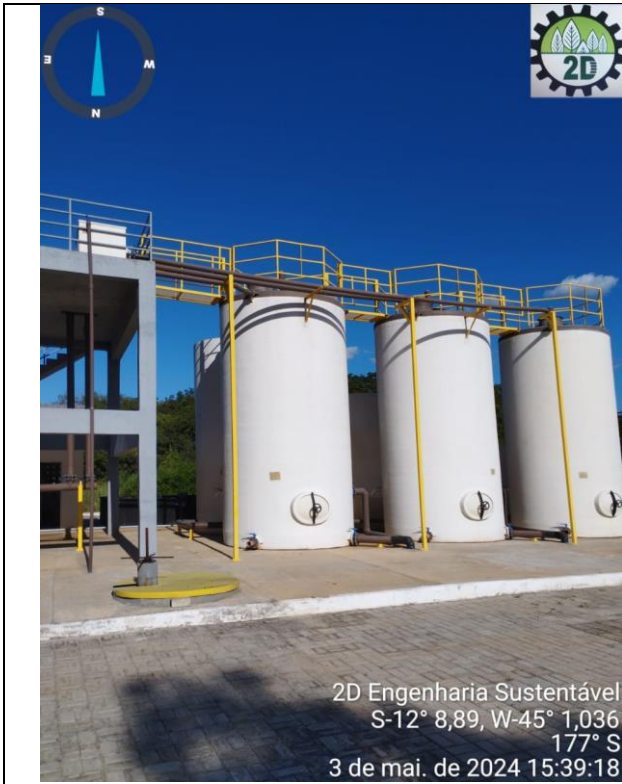

Observações: estação em operação.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização
