

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS
01/05/2024 a 31/05/2024

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB - Barreiras -Ba**

DADOS DA OBRA:

- Empresa: 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA
- Termo de Contrato nº : 011/2023.
- Processo Administrativo nº :23520.007597/2021-82
- Data de início..... : 14/07/2023
- Previsão de Término..... : 14/07/2024
- Aditivo de prazo: 00,00
- Valor do Inicial do Contrato : R\$ 459.000,00
- Valor do Atual do Contrato : R\$ 459.000,00
- Ritmo do Contrato : em execução
- Período de medição : 01/05/2024 a 31/05/2024
- Valor medido..... : R\$ 00,00
- Valor acumulado..... : R\$ 247.740,71
- Saldo contratual..... : R\$ 211.259,29

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB- Barreiras-Bahia**

Em atendimento a solicitação do setor de fiscalização da UFOB, apresentamos relatório fotográfico dos serviços executados na Estação de Tratamento de Efluentes da UFOB.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

Serviços	STATUS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE , NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB, EM BARREIRAS	

SERVIÇOS	STATUS
Relatório fotográfico serviços executados no período	
	
	

Observações: recolhimento de materiais.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Relatório de Serviços Executados Estação de Tratamento de efluentes da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

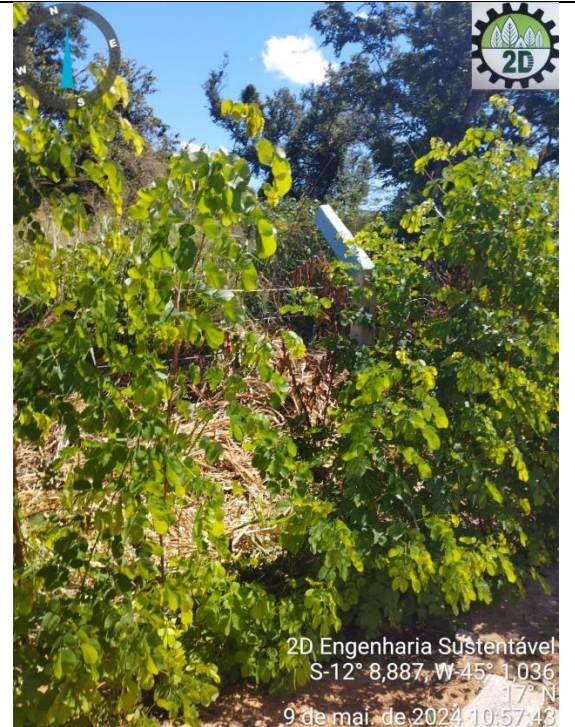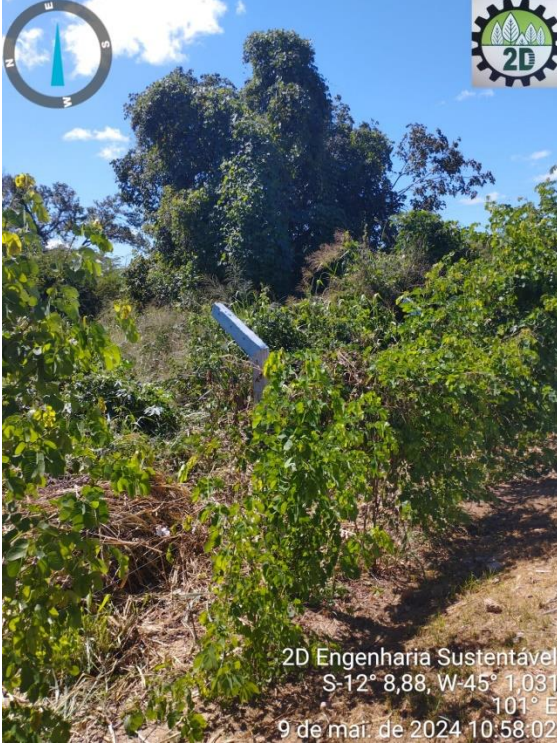

Observações: limpeza de vegetação próxima a cerca.



CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

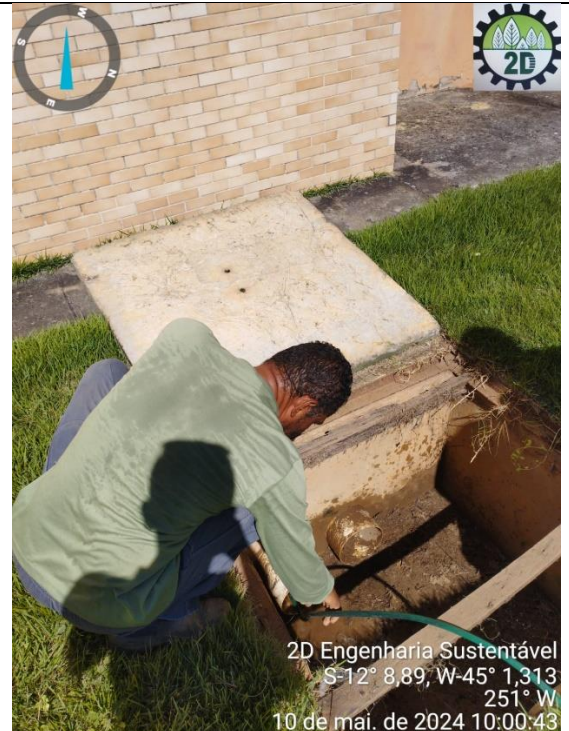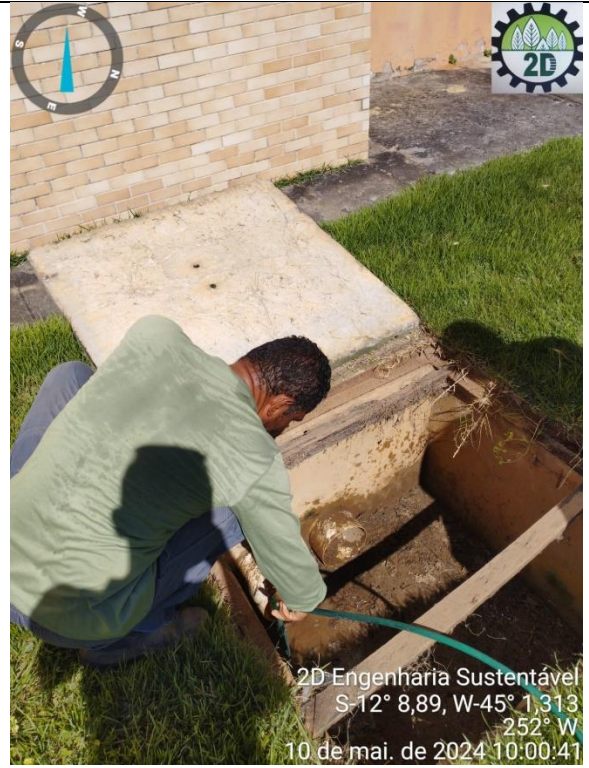

Observações: investigação em caixas de drenagem.




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

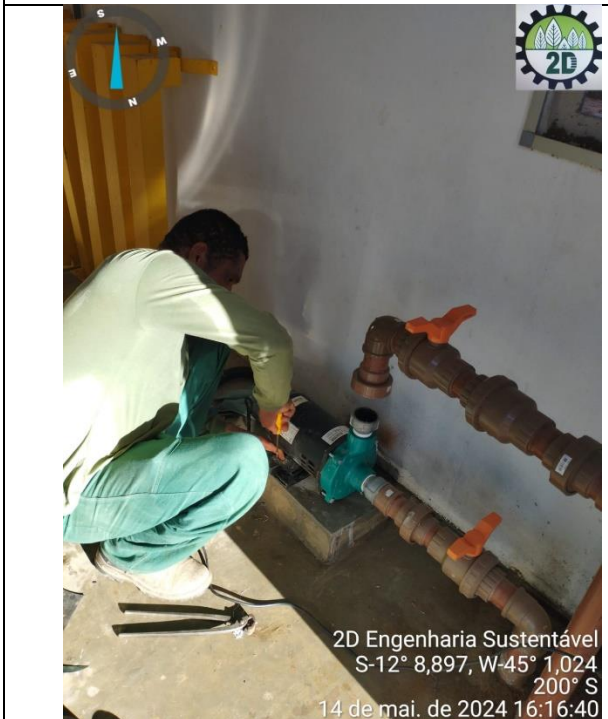

Observações: manutenção hidráulica.




CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

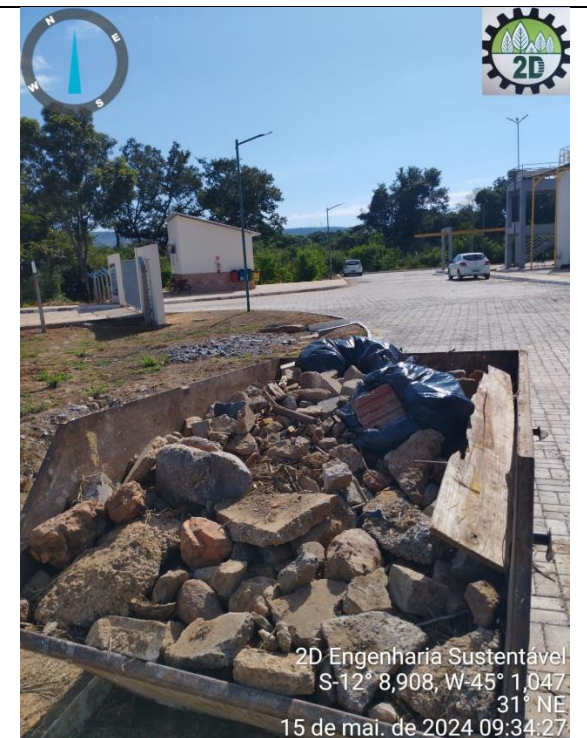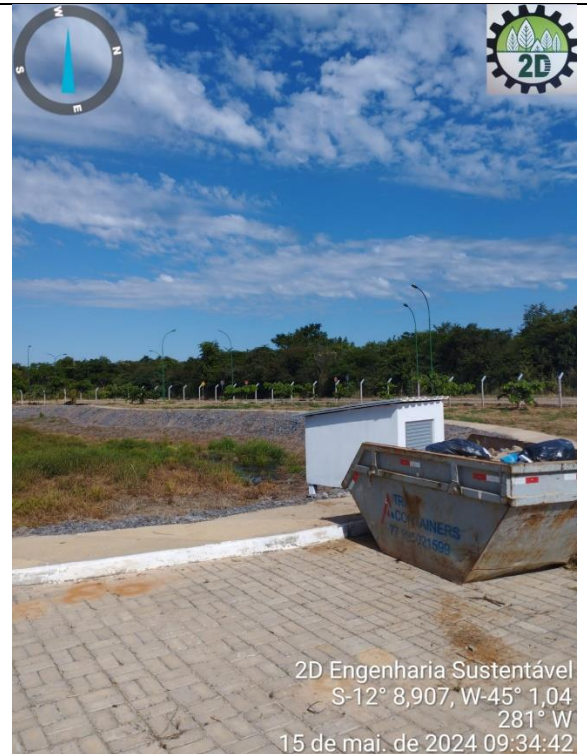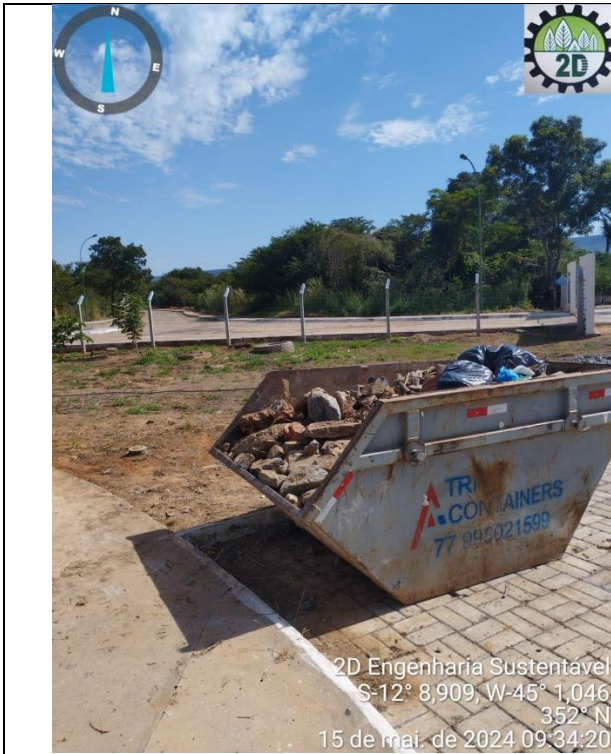

Observações: recolhimento de entulho.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024



Observações: estação em operação.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,885, W-45° 1,04
11° N
23 de mai. de 2024 14:20:40



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,888, W-45° 1,037
216° SW
23 de mai. de 2024 14:31:22



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,885, W-45° 1,04
20° N
23 de mai. de 2024 14:20:38



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,889, W-45° 1,037
216° SW
23 de mai. de 2024 14:31:25

Observações: aplicação de rejunte em sanitário e sala de administração.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024

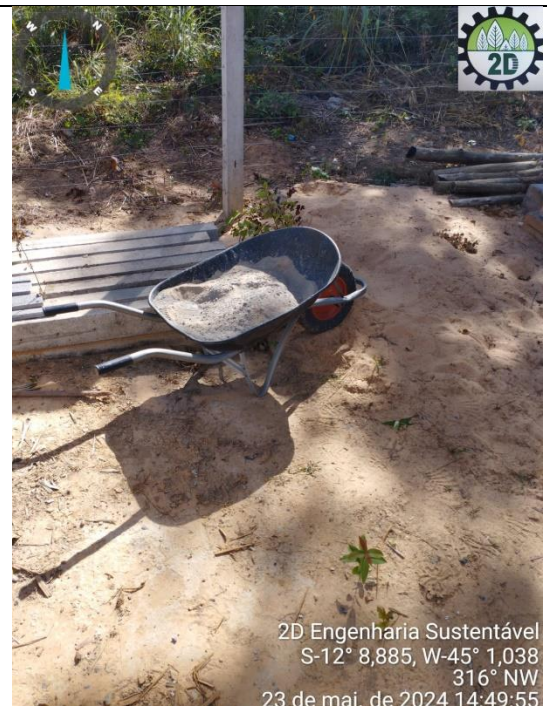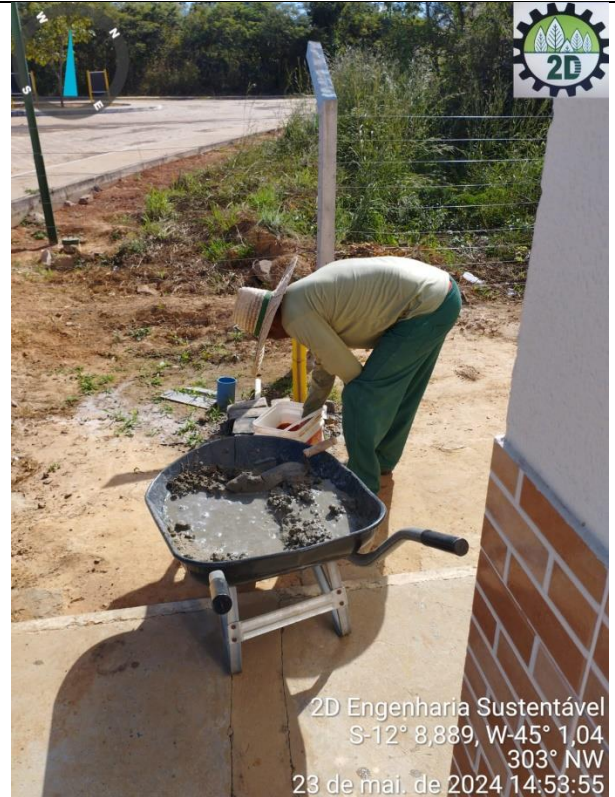

Observações: correção estrutural.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024


Data da Elaboração:
03/06/2024



2D Engenharia Sustentável
177° S
28 de mai. de 2024 09:47:08



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,891, W-45° 1,024
176° S
28 de mai. de 2024 09:47:13

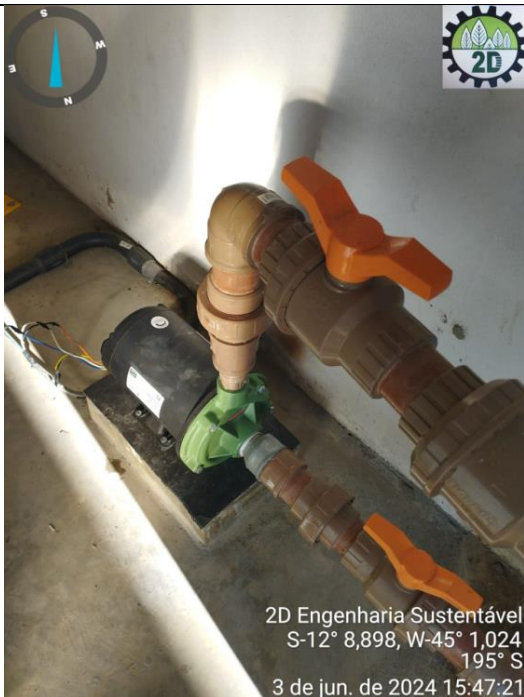

2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,898, W-45° 1,024
195° S
3 de jun. de 2024 15:47:21



2D Engenharia Sustentável
S-12° 8,892, W-45° 1,023
170° S
28 de mai. de 2024 09:47:11

Observações: troca de bomba.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/05/2024 a 31/05/2024

Data da Elaboração:
03/06/2024



Observações: instalação de reservatório para irrigação das mudas presentes na estação.
